









































































ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	febbraio 01 06
1			DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI CILAS	1 g	lun 21/02/22	lun 21/02/22			
2			Ordine allestimento ponteggi	3 g	mar 22/02/22	gio 24/02/22	1	CONDOMINIO	
3			Allestimento PONTEGGI montaggio e smontaggio	240 g	ven 25/02/22	gio 26/01/23	2	LAMANNA	
4			Ordine isolante termico	7 g	mar 22/02/22	mer 02/03/22	1	CONDOMINIO	
5			Isolazione termica pareti perimetrali	230 g	gio 03/03/22	mer 18/01/23	4	Impresa edile	
6			Ordine isolante COPERTURA	20 g	mar 22/02/22	lun 21/03/22	1	CONDOMINIO	
7			Isolazione termica solaio COPERTURA	50 g	mar 22/03/22	lun 30/05/22	6	Impresa edile	
8			Isolazione termica PLAFONE P.T.	20 g	gio 03/03/22	mer 30/03/22	4	Impresa edile	
9			Opere edili complementari ASCENSORE	10 g	gio 31/03/22	mer 13/04/22	8	Impresa edile	
10			Ordine ASCENSORE e SERVOSCALA	60 g	mar 22/02/22	lun 16/05/22	1	CONDOMINIO	
11			Impianto ASCENSORE	30 g	mar 17/05/22	lun 27/06/22	10	AMCA ascensori SpA	
12			Ordine FOTOVOLTAICO	30 g	mar 22/02/22	lun 04/04/22	1	CONDOMINIO	
13			Impianto FOTOVOLTAICO e ACCUMULATORI TETTO	40 g	mar 05/04/22	lun 30/05/22	12	ELMEC Solar Srl	
14			Ordine materiali BALCONI	30 g	mar 22/02/22	lun 04/04/22	1	CONDOMINIO	
15			Intervento BALCONI	30 g	mar 31/05/22	lun 11/07/22	7	Impresa edile	
16			Impianto servoscala	10 g	gio 05/05/22	mer 18/05/22	17	AMCA ascensori SpA	
17			Opere edili complementari SERVOSCALA	15 g	gio 14/04/22	mer 04/05/22	9	Impresa edile	
18			Opere edili complementari BOX	10 g	lun 20/06/22	ven 01/07/22	17	Impresa edile	
19			Ordine PARAPETTI	60 g	mar 22/02/22	lun 16/05/22	1	CONDOMINIO	
20			Parapetti in metallo e vetro	40 g	mar 12/07/22	lun 05/09/22	15	Fabro	
21			Nuove lattonerie	30 g	mar 31/05/22	lun 11/07/22	7	Lattoniere	


Progetto: Progetto Condomin
Data: mer 09/02/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
Cardine inattiva		Solo-fine			

ID	 	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	febbraio 01 06
22			Ordine SERRAMENTI e SCHERMATURE	60 g	mar 22/02/22	lun 16/05/22	1	CONDOMINIO	
23			Posa SERRAMENTI di facciata	40 g	mar 06/09/22	lun 31/10/22	15;22;24	F.Ili Caliaro	
24			Posa SCHERMATURE SOLARI	40 g	mar 12/07/22	lun 05/09/22	15;22	F.Ili Caliaro	
25			PROGETTO GIARDINO INTERNO	100 g	mar 31/05/22	lun 17/10/22	13	Impresa scavi/edile	
26			Sostituzione CALDAIE	20 g	mar 01/11/22	lun 28/11/22	23	VAILANT SpA	


Progetto: Progetto Condomin
Data: mer 09/02/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
Cardine inattiva		Solo-fine			

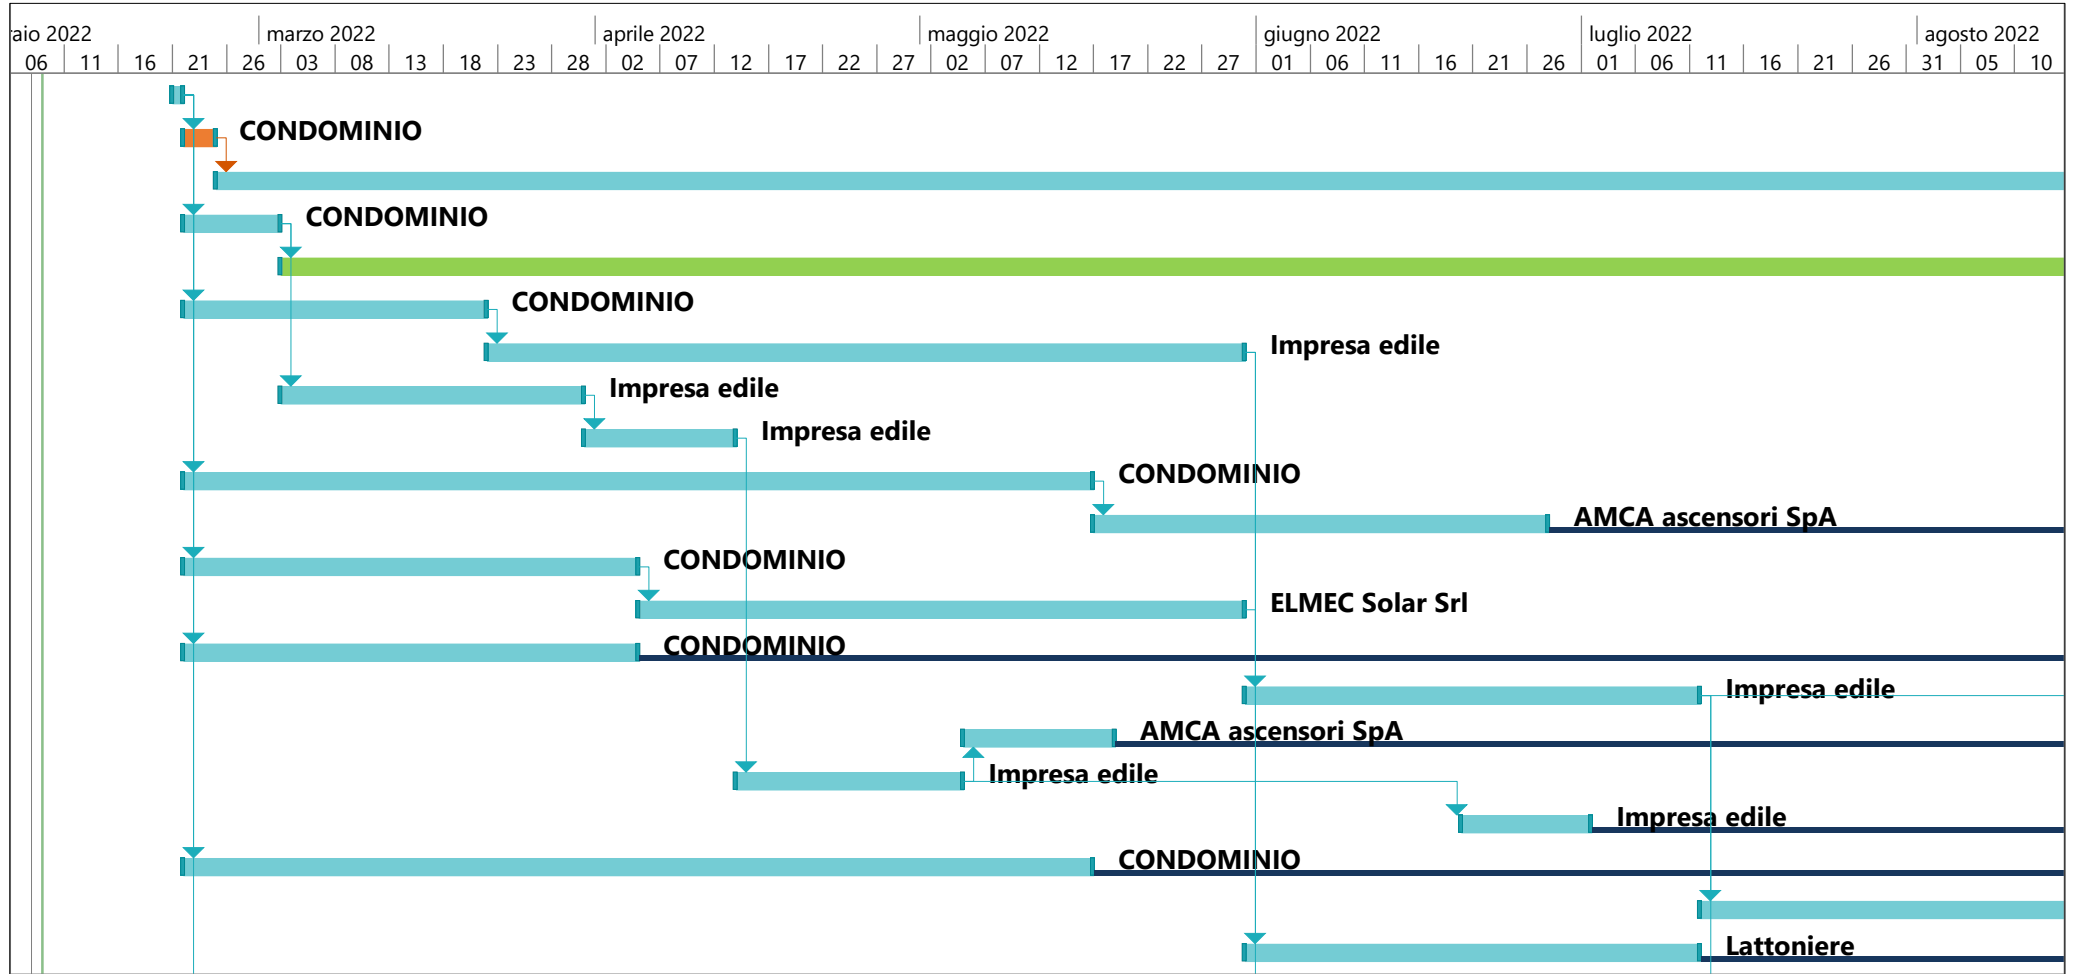


Progetto: Progetto Condomin
 Data: mer 09/02/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
Cardine inattiva		Solo-fine			

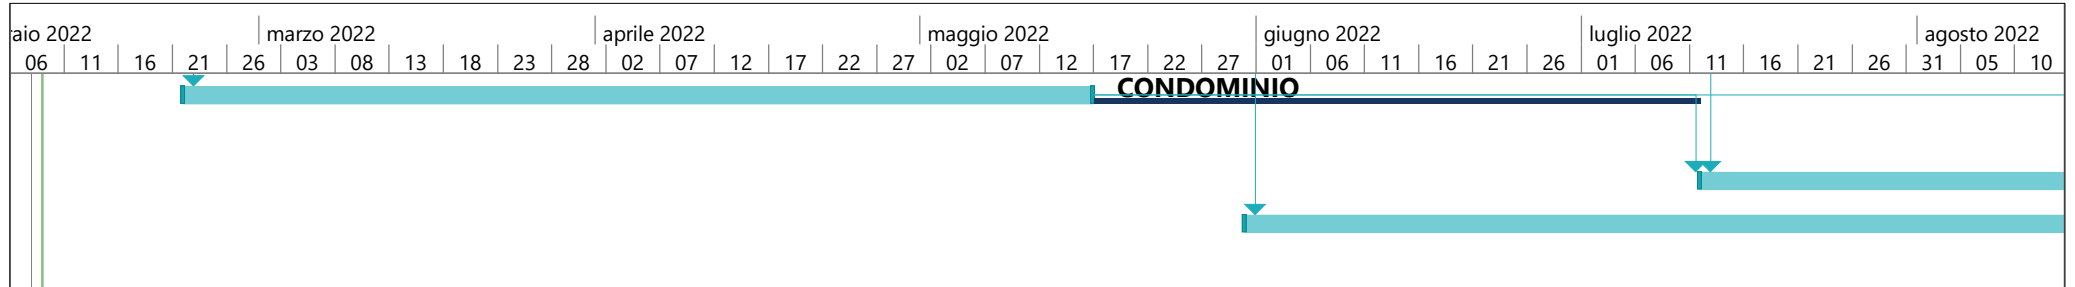


Progetto: Progetto Condomin
 Data: mer 09/02/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
Cardine inattiva		Solo-fine			

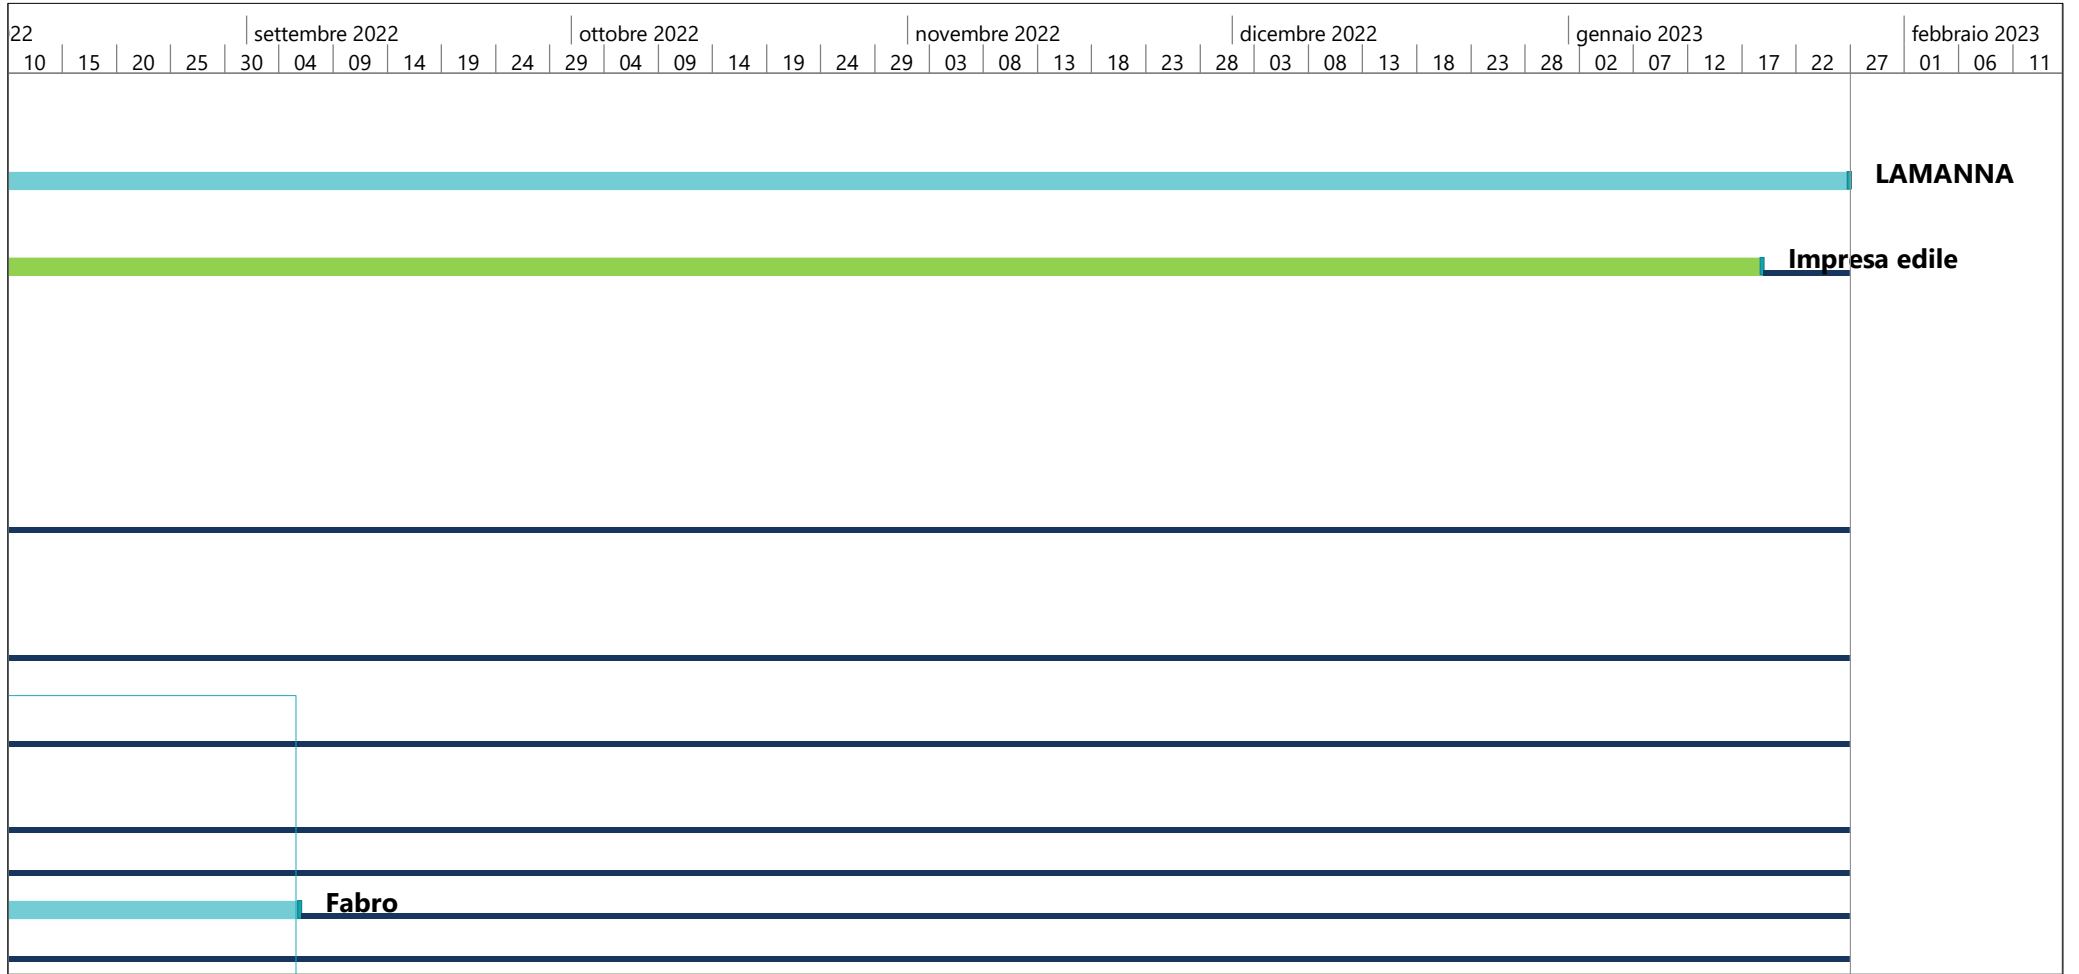

Progetto: Progetto Condomin
 Data: mer 09/02/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
Cardine inattiva		Solo-fine			

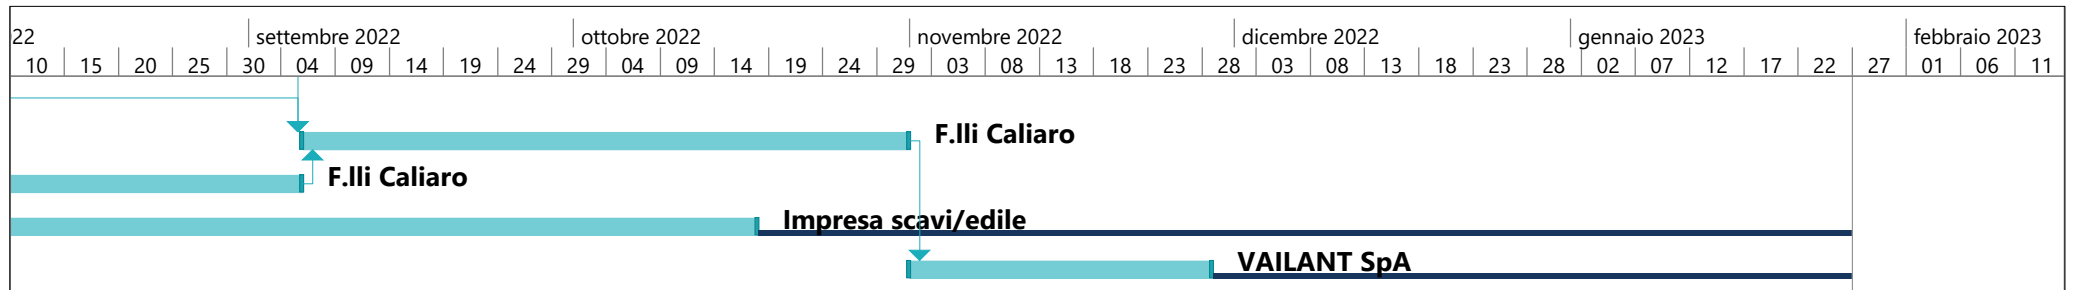


Progetto: Progetto Condomin
 Data: mer 09/02/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
Cardine inattiva		Solo-fine			

A

Progetto: Progetto Condomin Data: mer 09/02/22	Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
	Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
	Cardine		Solo-durata		Scadenza	
	Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
	Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
	Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
	Cardine inattiva		Solo-fine			



Progetto: Progetto Condomin
 Data: mer 09/02/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio		Margine di flessibilità	
Cardine inattiva		Solo-fine			
